

FASERING KLAVERHOF EN KLAVIER

Datum: 14-11-2025

Versie 1

LEGENDA

1 VOLGORDE START BOUW


STARTDATUM | OPLEVERDATUM
VERKOOPDATUM

aantallen | bouwlagen

 - HUUR

 - Bestaande woning
(Aardenhoek 36)

" Gearceerd gedeelte wordt tijdens bouwfase 1 gebruikt als bouwplaats, woonrijp opleveren in fase 5"

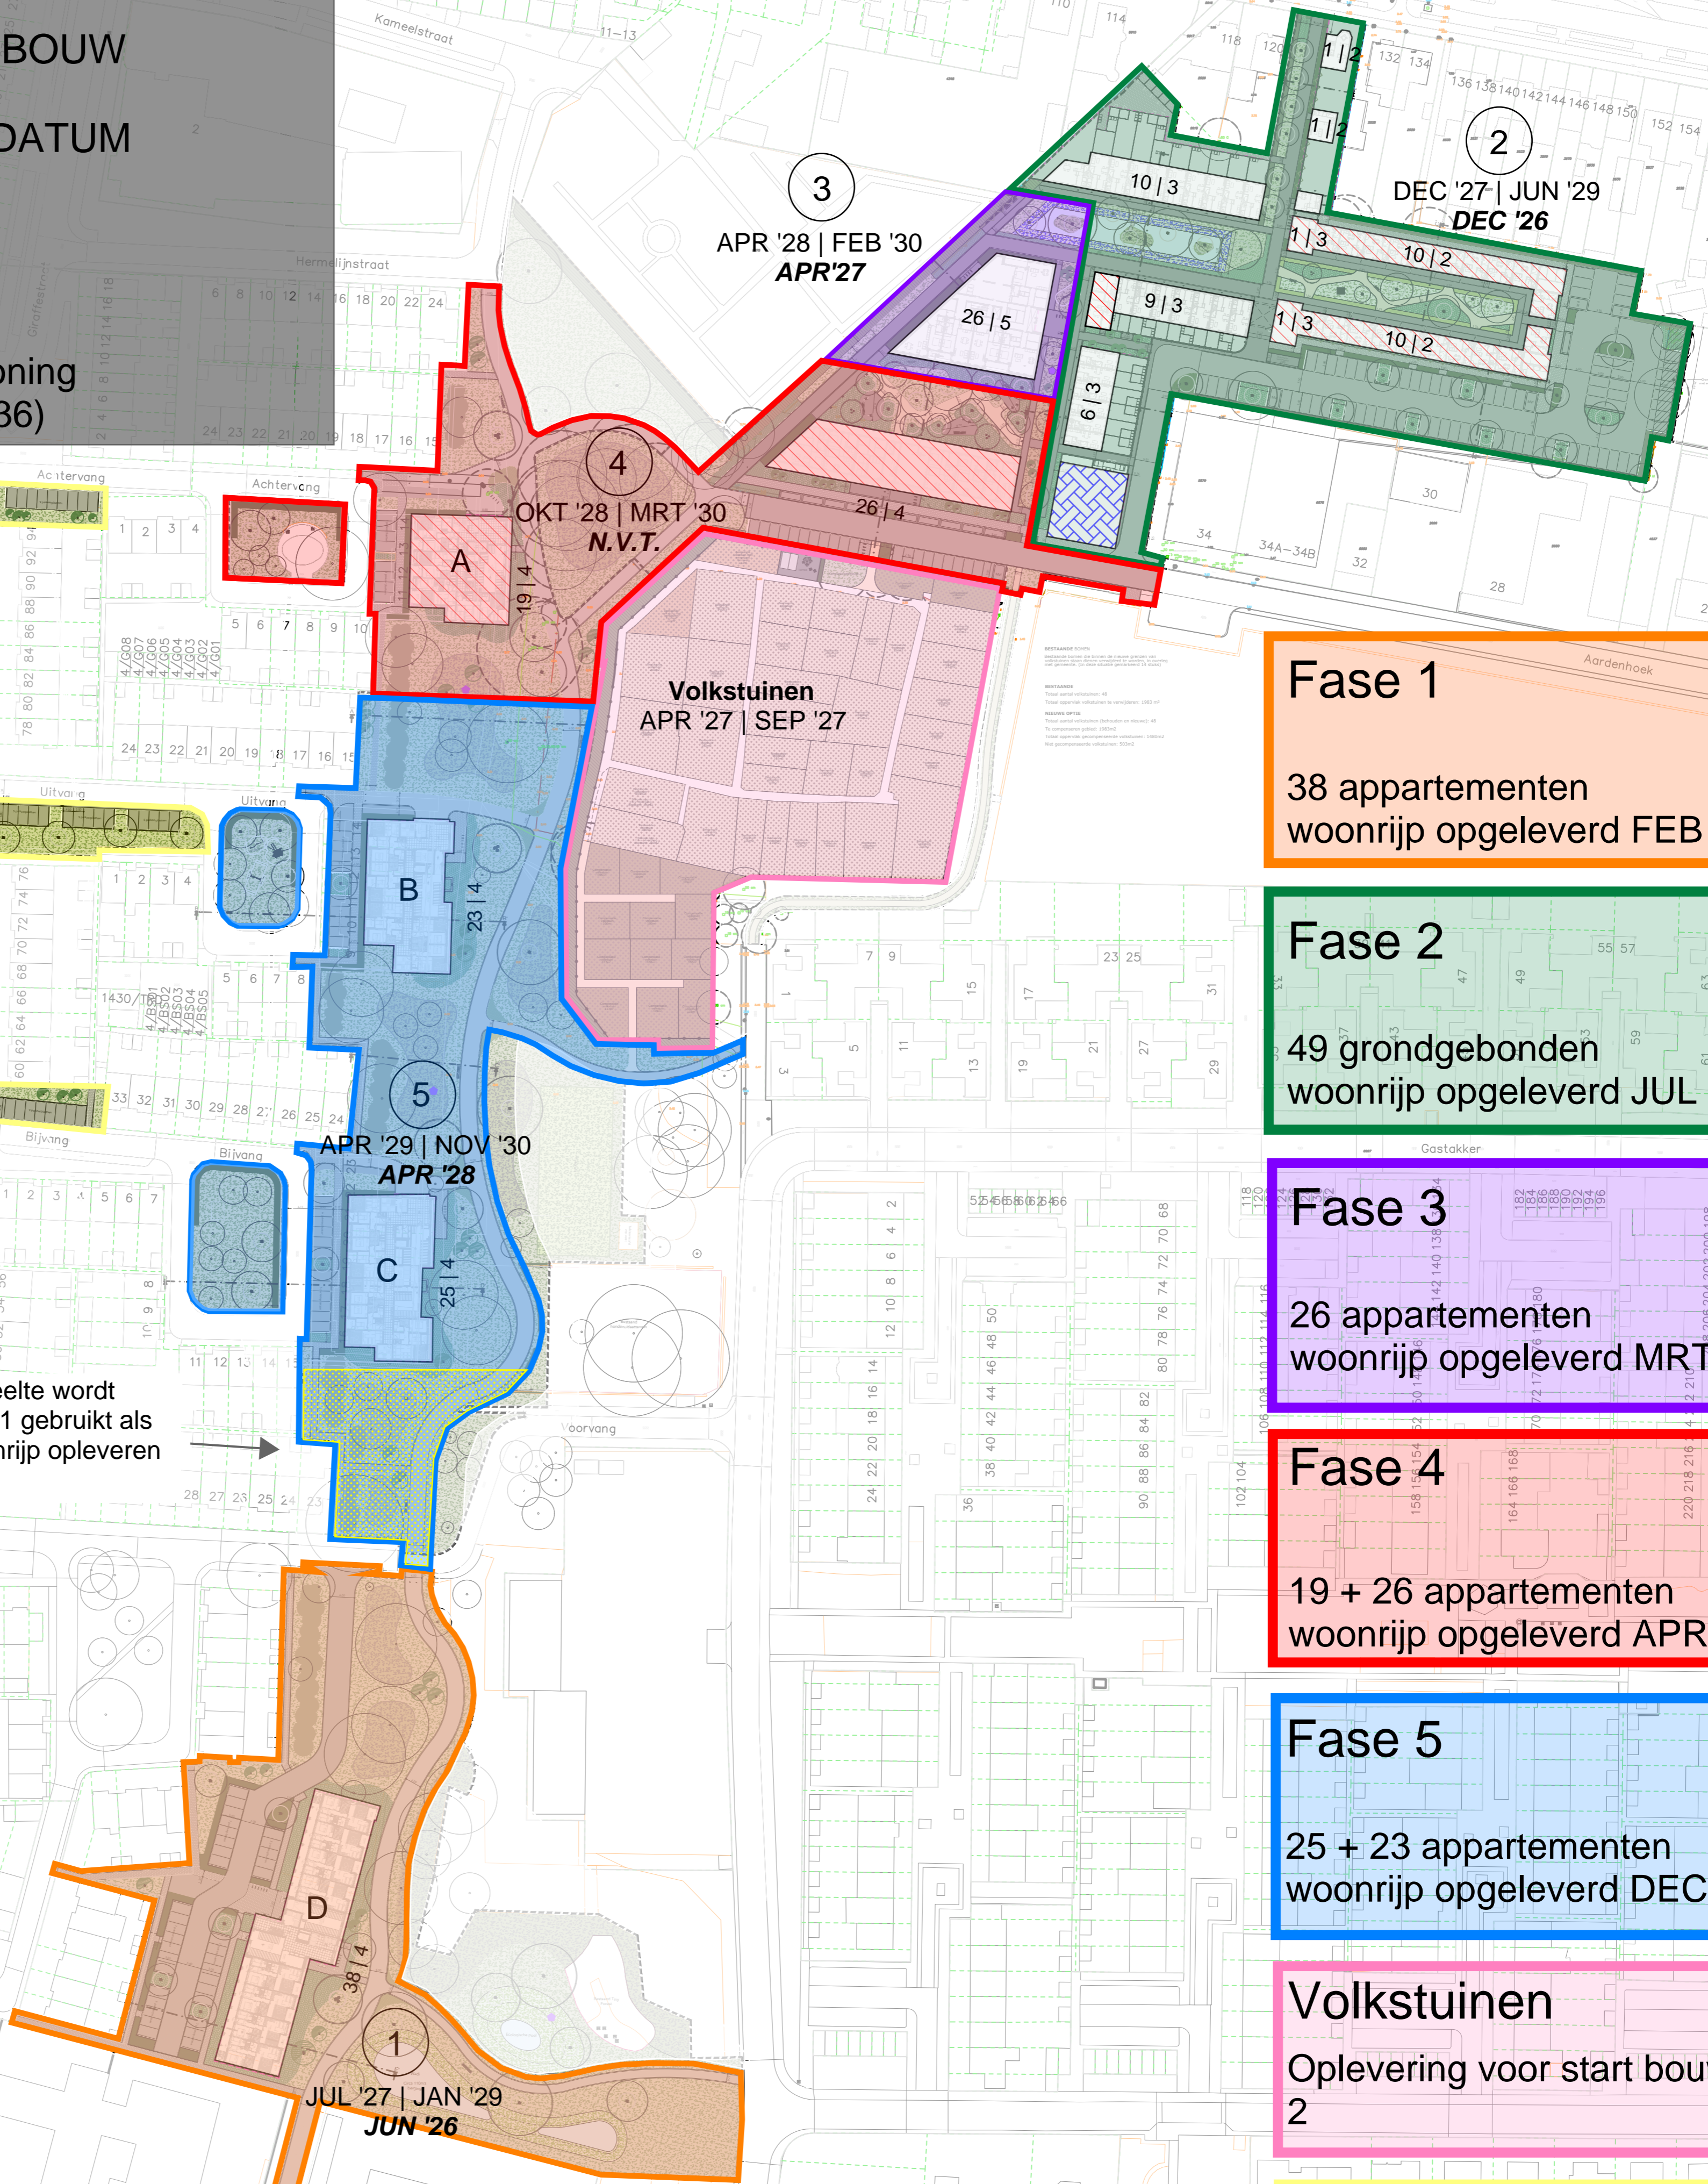

Fase 1
38 appartementen
woonrijp opgeleverd FEB '29

Fase 2
49 grondgebonden
woonrijp opgeleverd JUL '29

Fase 3
26 appartementen
woonrijp opgeleverd MRT '30

Fase 4
19 + 26 appartementen
woonrijp opgeleverd APR '30

Fase 5
25 + 23 appartementen
woonrijp opgeleverd DEC '30

Volkstuinen
Oplevering voor start bouw fase 2

Parkeerplaatsen
Start fase 1 | oplevering JUN '27

3
APR '28 | FEB '30
APR '27

2
DEC '27 | JUN '29
DEC '26

4
OKT '28 | MRT '30
N.V.T.

5
APR '29 | NOV '30
APR '28

1
JUL '27 | JAN '29
JUN '26

Volkstuinen
APR '27 | SEP '27
